

INFORME MENSUAL

COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL

Mayo 2026

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN	2
1. OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL	3
1.1. CAPACIDAD INSTALADA	3
1.2. GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3
1.3. VENTAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5
1.4. COSTOS MARGINALES REALES	5
1.5. PROBABILIDAD DE EXCEDENCIA	5
2. INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN	6
2.1. PROGRAMA DE OPERACIÓN PARA LOS SIGUIENTES 12 MESES	6
2.2. GENERACIÓN DE ENERGÍA ESPERADA	6
2.3. STOCK DE COMBUSTIBLES DISPONIBLE PARA GENERACIÓN	6
2.4. INDISPONIBILIDAD DE INSTALACIONES	6
2.5. TRAMOS DE COSTO DE FALLA	6
2.6. MODELOS DEL SISTEMA DE TRANSMISIÓN	6
3. CAMBIOS EN EL ESTADO DE INSTALACIONES	7
3.1. INSTALACIONES DE GENERACIÓN	7
3.2. INSTALACIONES DE TRANSMISIÓN	11

INTRODUCCIÓN

El Coordinador Eléctrico Nacional es un organismo técnico e independiente, encargado de la coordinación de la operación del conjunto de instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) que operen interconectadas entre sí, cuya cobertura geográfica comprende desde las regiones de Arica y Parinacota, por el Norte, hasta la Isla Grande de Chiloé, por el Sur, con una longitud cercana a los 3.100 km.

Según lo señala el artículo 60 del Reglamento de la Coordinación y Operación del Sistema Eléctrico, y con el fin de proveer información de calidad, oportuna y transparente, el Coordinador pone a disposición la siguiente información de interés para estudios y análisis del mercado eléctrico chileno:

- a) Programa de operación para los siguientes 12 meses, incluyendo niveles de operación de los embalses, disponibilidad de combustible para generación y la generación esperada de cada central;
- b) Indisponibilidad y programa de mantenimiento preventivo de las instalaciones;
- c) Disponibilidad de combustibles para generación eléctrica;
- d) Proyectos que se encuentren en período de puesta en servicio indicando la fecha de inicio y las principales características del proyecto;
- e) Proyectos que hayan entrado en operación indicando la respectiva fecha y las principales características del proyecto;
- f) Tramos de costo de falla;
- g) Modelación del sistema de transmisión; y
- h) Programas de mantenimiento, solicitudes de trabajo y de desconexión de instalaciones.

En cumplimiento con lo señalado, se presenta el Informe Mensual del Coordinador Eléctrico Nacional, con información al cierre de abril de 2026, el cual está estructurado en tres capítulos, cuyo contenido se resumen a continuación:

- i. Operación del Sistema Eléctrico Nacional: corresponde a información estadística de la operación real del SEN, respecto de la capacidad instalada del SEN, generación de energía eléctrica, ventas de energía eléctrica, costos marginales de energía y el año hidrológico.
- ii. Información para la Planificación de la Operación: corresponde a información necesaria para realizar la planificación de la operación del SEN.
- iii. Cambios en el Estado de Instalaciones: se presentan los proyectos que se encuentran en período de puesta en servicio y aquellos que han entrado en operación.

1. OPERACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO NACIONAL

En este capítulo, se presenta un panorama general de la operación real del SEN ocurrida durante el mes de abril de 2026.

1.1. Capacidad Instalada

La capacidad instalada (potencia máxima bruta) del SEN al cierre de abril de 2026 alcanzó los 39.857,1 MW (considerando 2.718 MW en proyectos con periodo de puesta en servicio), de los cuales el 24,1% es provisto por centrales termoeléctricas, y el 18,9% por centrales hidroeléctricas, como se muestra en la tabla.

Tipo de Tecnología	MW	[%]
Hídrica	7.552,7	18,9%
Embalse	4.184,7	10,5%
Pasada	3.368,0	8,5%
Térmica	12.629,3	24,1%
Gas Natural	5.384,5	13,5%
Carbón	3.138,2	0,2%
Diésel	3.083,6	7,7%
Termosolar	114,4	0,3%
Otros Térmicos*	908,6	2,3%
Eólica	6.352,2	15,9%
Solar	13.227,9	33,2%
Geotérmica	94,88	7,9%

* Otros térmicos: Biogás, Biomasa, Fuel Oil, Petcoke y Cogeneración.

1.2. Generación de energía eléctrica

La participación en la generación de energía mensual según tipo de tecnología durante el mes, y su comparación con igual periodo del año anterior, se resume en el siguiente cuadro:

SEN	abr-25 [GWh]	abr-25 [%]	abr-26 [GWh]	abr-26 [%]
Hídrico	1.501,6	22,2%	1.201,4	17,4%
Térmico	2.957,3	43,7%	2.829,3	40,9%
Eólico	870,0	12,9%	1.083,5	15,7%
Solar	1.428,7	21,1%	1.797,7	26,0%
Geotérmico	10,0	0,1%	10,0	0,1%
Total	6.767,5	100,0%	6.921,9	100%

A su vez, la generación de energía en el SEN presentó los siguientes indicadores, en cuanto a generación máxima y mínima horaria, máxima diaria y mensual:

Generación	abril-2025	abril-2026	Δ% 2026-2025
Máx. horaria [MWh/h]	12.178,3	12.571,4	+3,2%
	Día 30, hora 13	lunes-27-abril-26, Hora 15	
Mín. horaria [MWh/h]	7.745,6	7.534,3	-2,7%
	Día 27, hora 8	miércoles-04-abril-26, Hora 3	
Máx. diaria [GWh/día]	246,4	246,8	+0,1%
	miércoles-30-abril-25	martes-28-abril-26	
Mensual [GWh/mes]	6.767,5	6.921,9	+2,3%

La generación por tipo de combustible se presenta en el siguiente cuadro:

DETALLE PRODUCCIÓN		
Tipo	SEN [GWh]	%
Solar	1.797,7	26,0%
Eólica	1.083,5	15,7%
Geotérmica	10,0	0,1%
Termosolar	5,9	0,1%
Biogás	13,3	0,2%
Biomasa	136,4	2,0%
Carbón	1.284,7	18,6%
Cogeneración	95,5	1,4%
Gas Natural	1.248,2	18,0%
Diésel	30,7	0,4%
Fuel Oil	0,3	0,0%
GLP	0,6	0,0%
Petcoke	13,9	0,2%
Hidráulica Pasada	523,8	7,6%
Hidráulica Embalse	677,6	9,8%
Total	6.921,9	100%

En la Figura 1 se presenta la participación de cada región en la generación de energía eléctrica, en GWh, separado por tipo de tecnología.

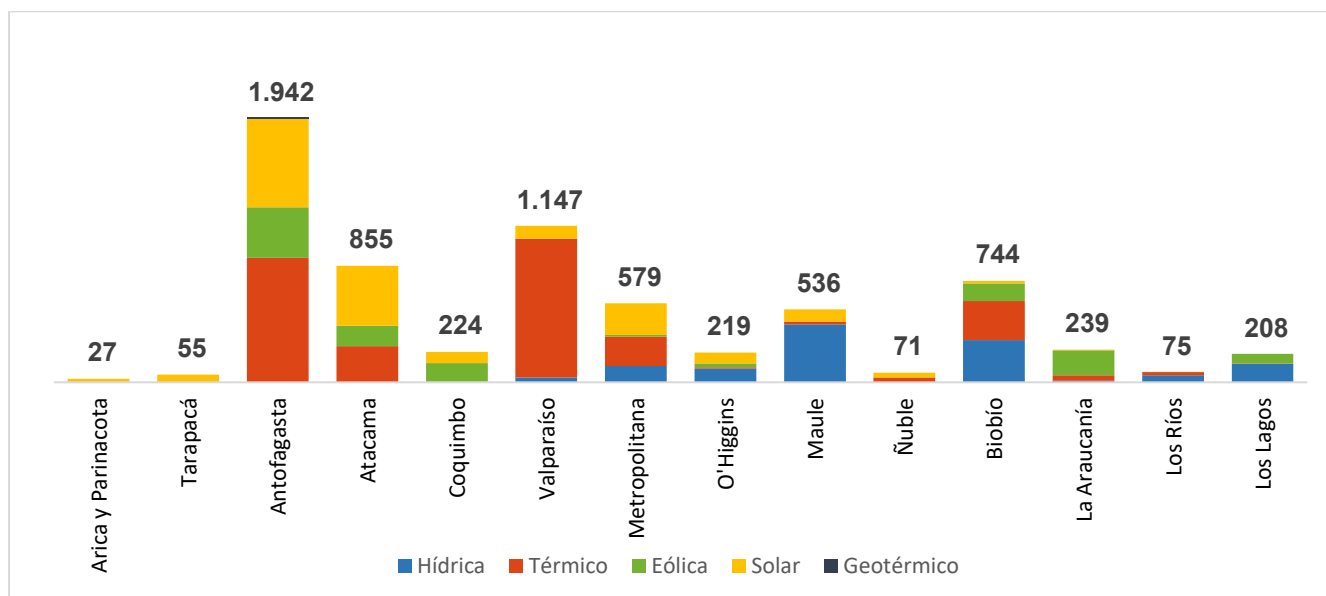


Figura 1: Generación de energía eléctrica, en GWh, por región y tecnología.

Adicionalmente, el detalle de la generación de energía renovable no convencional (ERNC), según lo establecido en la Ley 20.257, se detalla en el siguiente cuadro:

Calificación	Tipo	SEN [GWh]
Convencional	Hidráulica Embalse	677,6
	Hidráulica Pasada	523,8
	Termoeléctrica	2.829,3
	Total Convencional	4.030,7
ERNC (Ley 20.257)	Hidráulica Pasada	162,9
	Biocombustibles	148,3
	Eólica	1.083,5
	Solar	1.797,7
	Termosolar	5,9
	Geotérmica	10,0
	Cogeneración	29,5
	Total ERNC	3.237,8

* Carbón, Diésel, Gas Natural, Petcoke, Fuel Oil, Biocombustibles (biogás, biomasa) y cogeneración.

1.3. Ventas de energía eléctrica

La siguiente tabla muestra el detalle de las ventas de energía para el mes de abril, por tipo de cliente.

Nota: Estimación de ventas a la fecha de publicación del reporte.

Ventas (GWh)	abr-25 [GWh]	abr-26 [GWh]	Δ% 2026 vs 2025
Regulados	2.323,7	2.367,8	+1,9%
Libres	4.031,9	4.108,4	+1,9%
Total	6.355,7	6.476,2	+1,9%

1.4. Costos marginales reales

Durante abril, el Costo Marginal Real de energía (US\$/MWh), en barras representativas del SEN, presentó las siguientes variaciones respecto del mismo mes del año 2025:

Año	Crucero	P. de Azúcar	Quillota	Alto Jahuel	Charrúa	Pto. Montt
2025	79,8	84,3	95,4	96,2	94,9	100,5
2026	36,6	36,0	41,8	42,1	41,8	44,1
Δ%	-54,1%	-57,4%	-56,2%	-56,2%	-55,9%	-56,1%

1.5. Probabilidad de excedencia

Finalmente, cabe destacar que, para el SEN, las características del año hidrológico abr25 – mar26, al cierre de abril, muestran que la probabilidad de excedencia alcanzó el 89,7% (año del tipo seco).

2. INFORMACIÓN PARA LA PLANIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN

En este capítulo se presenta información relativa a la planificación de la operación segura y económica del SEN.

2.1. Programa de Operación para los siguientes 12 meses

Este programa mensual de generación tiene por objetivo estudiar la situación de abastecimiento del SEN durante 12 meses, bajo diferentes condiciones hidrológicas. En particular se presentan los resultados de energía generada por tipo de aporte, las trayectorias de cotas de los embalses, la energía embalsada y los costos marginales. Este programa se encuentra publicado en el sitio web del Coordinador ¹.

2.2. Generación de energía esperada

La generación detallada por central y por tipo de tecnología se encuentra en el programa mensual de generación de 12 meses, publicado en el sitio web del Coordinador ¹.

2.3. Stock de combustibles disponible para generación

El stock de combustibles disponibles para la generación de las centrales del SEN se encuentra en la plataforma Sistema de Costos Variables e Información de Combustibles ².

2.4. Indisponibilidad de instalaciones

2.4.1. Programa de Mantenimiento Preventivo

El programa de mantenimiento preventivo utilizado en la planificación de la operación se encuentra en el programa mensual de generación de 12 meses publicado en el sitio web del Coordinador ³.

2.4.2. Eventos no programados

Los eventos no programados ocurridos en la operación del mes, que han tenido como resultado la elaboración de un Estudio de Análisis de Falla (EAF) de acuerdo con la Normativa vigente, se encuentran publicados en el sitio web del Coordinador ⁴.

2.5. Tramos de costo de falla

Los Costos de Racionamiento utilizados corresponden a aquellos publicados por la Comisión Nacional de Energía en su Informe de Fijación de Precios de Nudo, estos se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1: Costo racionamiento SEN abril 2026

Profundidad de Falla [%]	Costo de Racionamiento [USD/MWh]
0-5%	492,4
5-10%	541,7
10-20%	648,6
Sobre 20%	742,1

2.6. Modelos del sistema de transmisión

La modelación del Sistema de Transmisión del SEN se encuentra publicado en el sitio web del Coordinador ⁵.

¹ <https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/estudios-de-la-programacion-de-la-operacion/programacion-mensual/>

² <http://costosvariables.coordinador.cl/>

³ <https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/programa-mantenimiento-preventivo-abril-2/>

⁴ <https://www.coordinador.cl/operacion/documentos/estudios-operacionales/estudios-de-analisis-de-falla/>

⁵ <https://www.coordinador.cl/modelacion-sen/>

3. CAMBIOS EN EL ESTADO DE INSTALACIONES

A continuación, en este capítulo se presentan los proyectos que se encuentran en período de puesta en servicio y aquellos que han entrado en operación.⁶

3.1. Instalaciones de Generación

A continuación, se presenta el estado de las instalaciones de generación que se encuentran en período de puesta en servicio (PES), así como aquellas que han recibido en abril la calificación de Entregadas a la Operación (EO).

Tabla 2: Centrales en etapa PES al mes de abril.

CENTRAL	PROPIETARIO	ESTADO	TECNOLOGÍA	TIPO	CLASIFICACIÓN	PES	POTENCIA [MW]	REGIÓN
Hidroeléctrica Piedras Negras	Hidroeléctrica Piedras Negras SpA	En Pruebas	Hídrico	Hidro Pasada	Generador	24-10-2022	3	O'Higgins
Mapa (Etapa 2)	Celulosa Arauco y Constitución S.A.	En Pruebas	Térmica	Biomasa	Generador	23-11-2022	166	Biobío
La Gloria-21	La Gloria S.A.	En Pruebas	Térmica	Diésel	PMGD	17-05-2023	3,1	Maule
Monte Patria El Palqui	Fenix Solar SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	01-08-2023	2,992	Coquimbo
Ampliación de Sistema de almacenamiento de energía BESS-ALFALFAL	AES Andes S.A.	En Pruebas	BESS	BESS	BESS	06-07-2023	34,9	Metropolitana
Parque Fotovoltaico El Manzano	Enel Green Power Chile S.A.	En Pruebas	Solar	Solar	Generador	06-09-2023	87	Metropolitana
PMG Peñón Solar	Enlase Generación Chile S.A.	En Pruebas	Solar	Solar	PMG	17-10-2023	9	Coquimbo
EA SF Graneros	Energía Renovable Marengo SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	14-12-2023	3	O'Higgins
El Carpintero	PFV El Carpintero SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	02-01-2024	9	Maule
Mini Central Hidroeléctrica La Confianza	Hidroconfianza SpA	En Pruebas	Hídrico	Hidro Pasada	PMG	31-10-2023	3	Biobío
Higuán	Malloco Solar SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	08-02-2024	9	Metropolitana
BESS Parque Eólico La Cabaña	Enel Green Power Chile S.A.	En Pruebas	BESS	BESS	BESS	03-03-2024	32	La Araucanía
Parque PVP Mayos 2	Parque Solar Santa Cruz SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	28-03-2024	2,3	O'Higgins
Cabimas	Fotovoltaica Arrayán SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	14-03-2024	9	Maule
PFV Jilguero	PFV Jilguero SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	17-04-2024	1,7	Maule
Ampliación Fotovolt LIN	Ailin Fotovoltaica SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	15-04-2024	3	Maule
EA SF Pichulemu	Energía Renovable Caoba SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	08-04-2024	3	O'Higgins

⁶ Más información en el siguiente enlace <https://www.coordinador.cl/desarrollo/documentos/gestion-de-proyectos/reporte-de-proyecto-nuevas-instalaciones-y-modificaciones-relevantes/>

CENTRAL	PROPIETARIO	ESTADO	TECNOLOGÍA	TIPO	CLASIFICACIÓN	PES	POTENCIA [MW]	REGIÓN
PMGD RCU	RTN Solar SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	16-04-2024	6	Maule
Solarpark Mallona	Chronos Solar SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	12-04-2024	2,6	O'Higgins
PFV Fragata	PFV Fragata SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	20-12-2024	3	Valparaíso
Parque Solar San Vicente TT	Blue Solar Doce SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	23-12-2024	9	O'Higgins
Cetus (Ex La Viña)	La Viña Solar SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	09-01-2025	3	O'Higgins
Canquén	Canquén SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	14-01-2025	2,9	Biobío
Tes Solar	Tes Solar SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	15-01-2025	2,6	Ñuble
Gabardo Ampliación	Salado Energy SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	16-01-2025	6	Metropolitana
Perséfone	CVE Proyecto Treinta y Uno SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	17-01-2025	9	Coquimbo
FV El Trébol	Portezuelo SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	29-01-2025	3	O'Higgins
Solaris (ex Cerrillos)	Cerrillos SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	04-02-2025	9	Coquimbo
Aumento de Capacidad Los Olmos	Energía Eólica Los Olmos SpA	En Pruebas	Eólica	Eólica	MR	18-02-2025	10	Biobío
Peumo	Empresa Eléctrica Peumo SpA.	En Pruebas	Solar	Solar	PMG	20-03-2025	9	Ñuble
Parque Eólico Antofagasta	Parque Eólico Antofagasta SpA	En Pruebas	Eólica	Eólica	Generador	23-03-2025	364	Antofagasta
PFV Chamonate Solar (Ex Toledo Dos)	Toledo Solar SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	16-05-2025	9	Atacama
Boix BI	Boix SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	15-05-2025	3	Maule
FV Falcón	Energía Renovable Roble SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	29-05-2025	2,9	Metropolitana
Minicentral Hidroeléctrica Las Nieves	Hidroeléctrica Las Nieves SpA	En Pruebas	Hídrico	Hidro Pasada	MR	09-06-2025	6,5	La Araucanía
Central Hidroeléctrica Don Eugenio	Hidroeléctrica Don Eugenio SpA	En Pruebas	Hídrico	Hidro Pasada	Generador	20-07-2025	3	O'Higgins
Faro Santa Elena	Fotovoltaica Faro III SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	14-08-2025	9	O'Higgins
PFV Los Naranjos (Ex Cipres)	Empresa Eléctrica Cipres SpA.	En Pruebas	Solar	Solar	PMG	15-09-2025	9	Ñuble
Parque Solar Guindo Santo	Empresa Eléctrica Guindo Santo SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMG	17-09-2025	9	Ñuble
Parque Eólico Ckani - Etapa 1	AR Alto Loa SpA	En Pruebas	Eólica	Eólica	Generador	07-08-2025	107,2	Antofagasta
Elvira	Tedlar Mercurio SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	04-12-2025	4	Ñuble
PF Estepa Solar	Estepa Solar SpA	En Pruebas	Solar	Solar	Generador	30-01-2026	214	Antofagasta
PFV Gabriela + BESS (E1 y E2)	GR Lengua SpA	En Pruebas	Solar	Solar	Generador	09-02-2026	220	Antofagasta
Arena BESS	CI GMF II Arena ProjectCo SpA	En Pruebas	BESS	BESS	BESS	09-02-2026	220	Antofagasta
BESS Estepa Solar	Estepa Solar SpA	En Pruebas	BESS	BESS	BESS	02-02-2026	188	Antofagasta
BESS Los Loros	Engie Energía Chile S.A.	En Pruebas	BESS	BESS	BESS	14-02-2026	46	Atacama

CENTRAL	PROPIETARIO	ESTADO	TECNOLOGÍA	TIPO	CLASIFICACIÓN	PES	POTENCIA [MW]	REGIÓN
Chocalán 1	Aggreko Chile Ltda.	En Pruebas	Térmica	Diésel	PMGD	06-03-2026	3	Metropolitana
Don Renato	Fotovoltaica Don Renato SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	11-03-2026	2,86	Valparaíso
Santa Eugenia Solar	Santa Eugenia SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	11-03-2026	2,95	La Araucanía
BESS Libélula	Engie Energía Chile S.A.	En Pruebas	BESS	BESS	BESS	16-03-2026	199,2	Metropolitana
BESS Elena	Solar Elena SpA	En Pruebas	BESS	BESS	BESS	17-03-2026	485	Antofagasta
Las Romazas (Ex Estancilla)	Fotovoltaica Estancilla SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	18-03-2026	2,9	Valparaíso
PV Libélula	Engie Energía Chile S.A.	En Pruebas	Solar	Solar	Generador	30-03-2026	139,7	Metropolitana
Ballota	Manzanares Energía SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	09-04-2026	6	Maule
PMGD Alerce Gas	Innovación Energía S.A.	En Pruebas	Térmica	Diésel	PMGD	16-04-2026	3	Los Lagos
PSF Lota II	Tedlar Marte SpA	En Pruebas	Solar	Solar	PMGD	20-04-2026	2,35	Metropolitana
BESS Lota II	Tedlar Marte SpA	En Pruebas	BESS	BESS	PMGD	20-04-2026	2,35	Metropolitana

3.1.1. Centrales en etapa de Puesta en Servicio

La Figura 2 muestra la participación de los diferentes tipos de tecnología actualmente en pruebas (etapa PES). Asimismo, se muestra la cantidad de proyectos en ese estado [*].

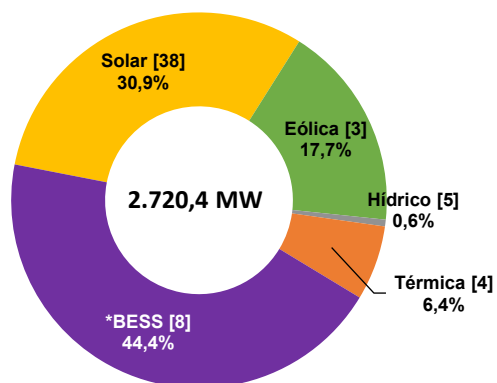


Figura 2: Centrales SEN en pruebas según tecnología.

*Nota: Los proyectos BESS no suman a la capacidad instalada.

3.1.2. Centrales entregadas a la operación

En la Tabla 3 se muestran las instalaciones de generación entregadas a la operación (EO) en abril.

Tabla 3: Centrales SEN entregadas a la operación.

No se registran centrales entregadas a la operación al cierre de abril-26

3.2. Instalaciones de Transmisión

En la Tabla 4 se presentan las instalaciones de transmisión que se interconectaron durante el mes de abril.

Tabla 4: Instalaciones de transmisión energizadas.

PROPIETARIO	FECHA	INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN ENERGIZADA
STM	11-04-2026	S/E Recoleta Celdas y Barra de 12 kV N°1.
Besalco Energía	12-04-2026	Línea de 66 kV Los Varones - El Avellano 1.
Besalco Energía	12-04-2026	Línea de 66 kV Los Varones - El Avellano 2.
ENGIE	17-04-2026	Línea 220 kV Jadresic - Pampa Fidelia.
ENGIE	18-04-2026	S/E Pampa Fidelia Barra Principal de 220 kV.
ENGIE	18-04-2026	S/E Pampa Fidelia Barra de Transferencia de 220 kV.
ENGIE	18-04-2026	BESS Kallpa Barras 7 y 8 de 33 kV.
ENGIE	20-04-2026	Línea de 220 kV Entre Ríos - PE Chequenes.
ENGIE	20-04-2026	S/E Pampa Fidelia primera energización de TR-1 de 220/33 kV, 180 MVA.
ENGIE	20-04-2026	S/E Pampa Fidelia primera energización de TR-2 de 220/33 kV, 180 MVA.
ENGIE	21-04-2026	S/E Chequenes primera energización del TR1 220/33 kV, 175 MVA.
ENORCHILE	23-04-2026	S/E Los Vilos Paño 52E3 y línea de 23 kV Los Vilos - C. PV Caimanes primera energización.
S/E Punta de Talca 52F1.	25-04-2026	S/E Punta de Talca 52F7 y Barra N°2 de 33 kV.
Innergex	26-04-2026	S/E San Andrés, BESS San Andrés 2.
ENGIE	28-04-2026	Línea de 220 kV TEN - BESS Lile (En vacío)
